



Übersicht erster Bauabschnitt

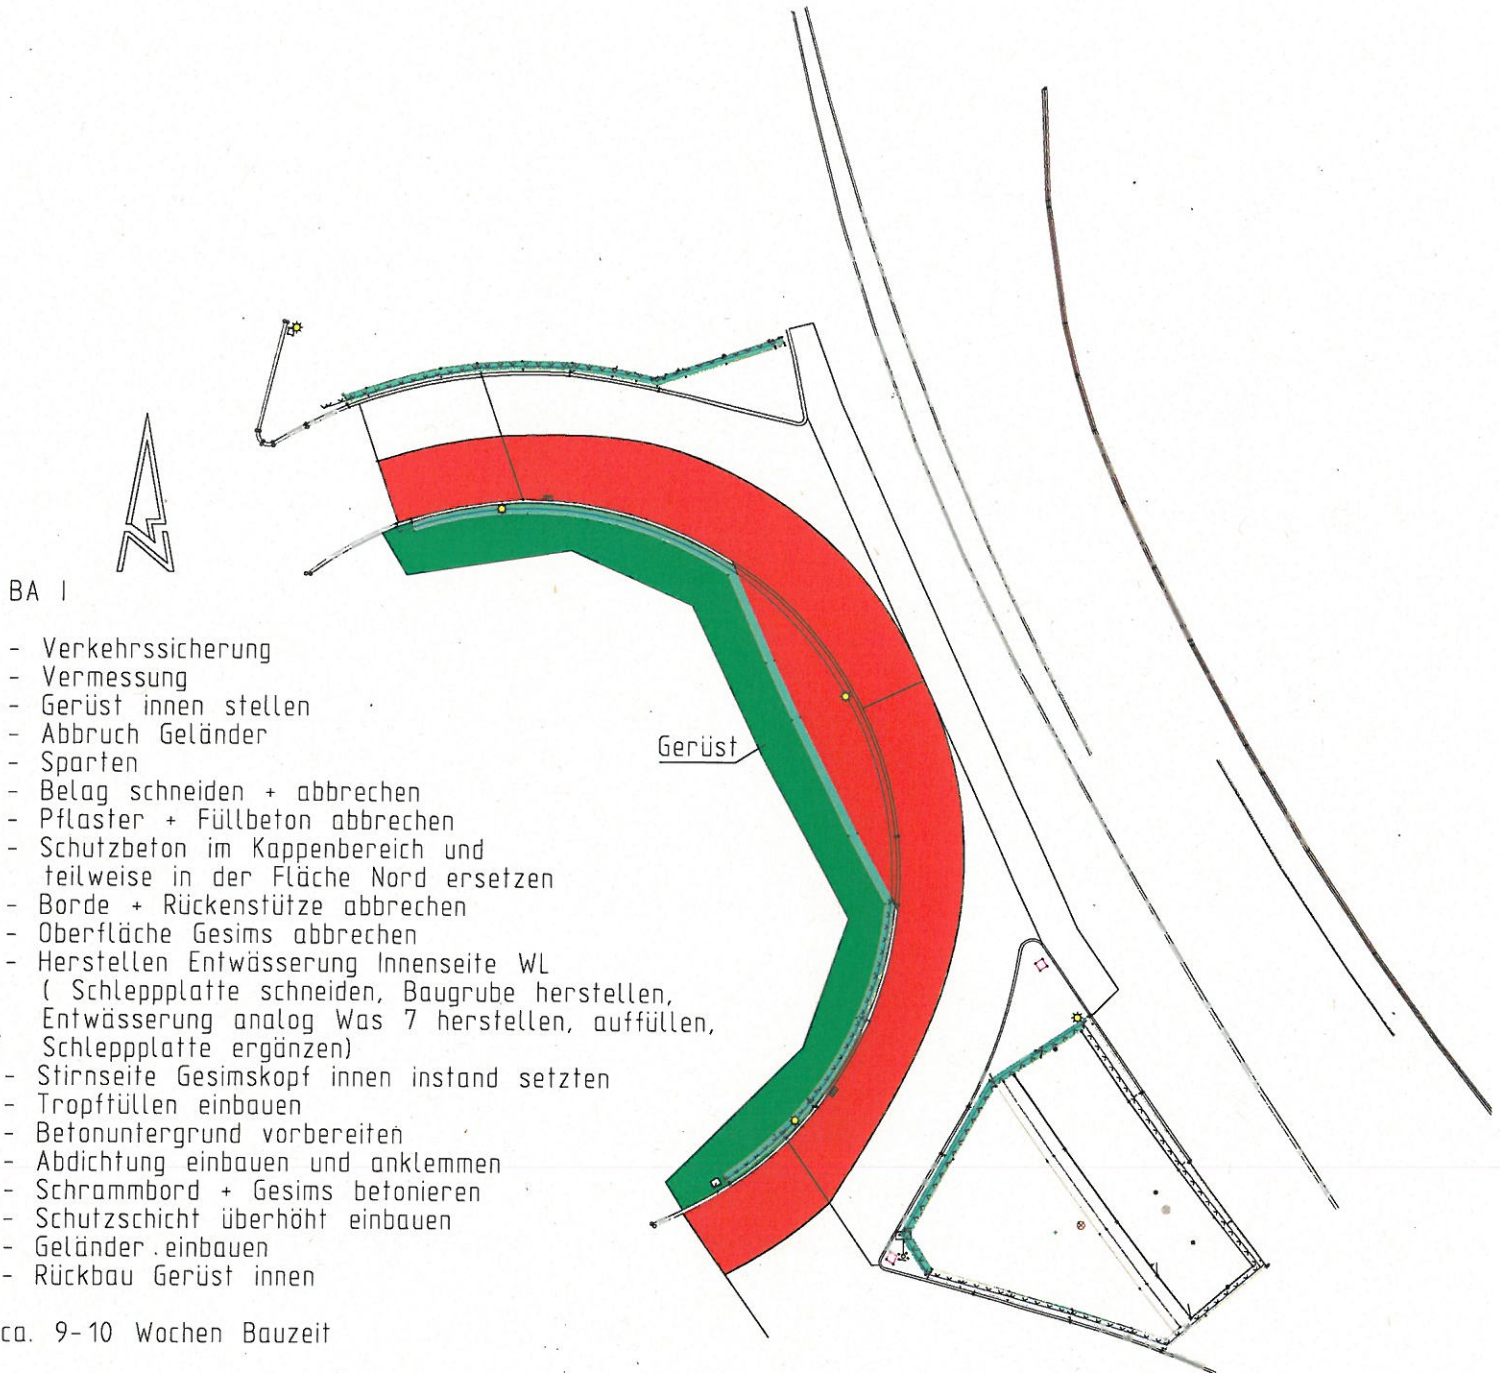

Übersicht zweiter Bauabschnitt

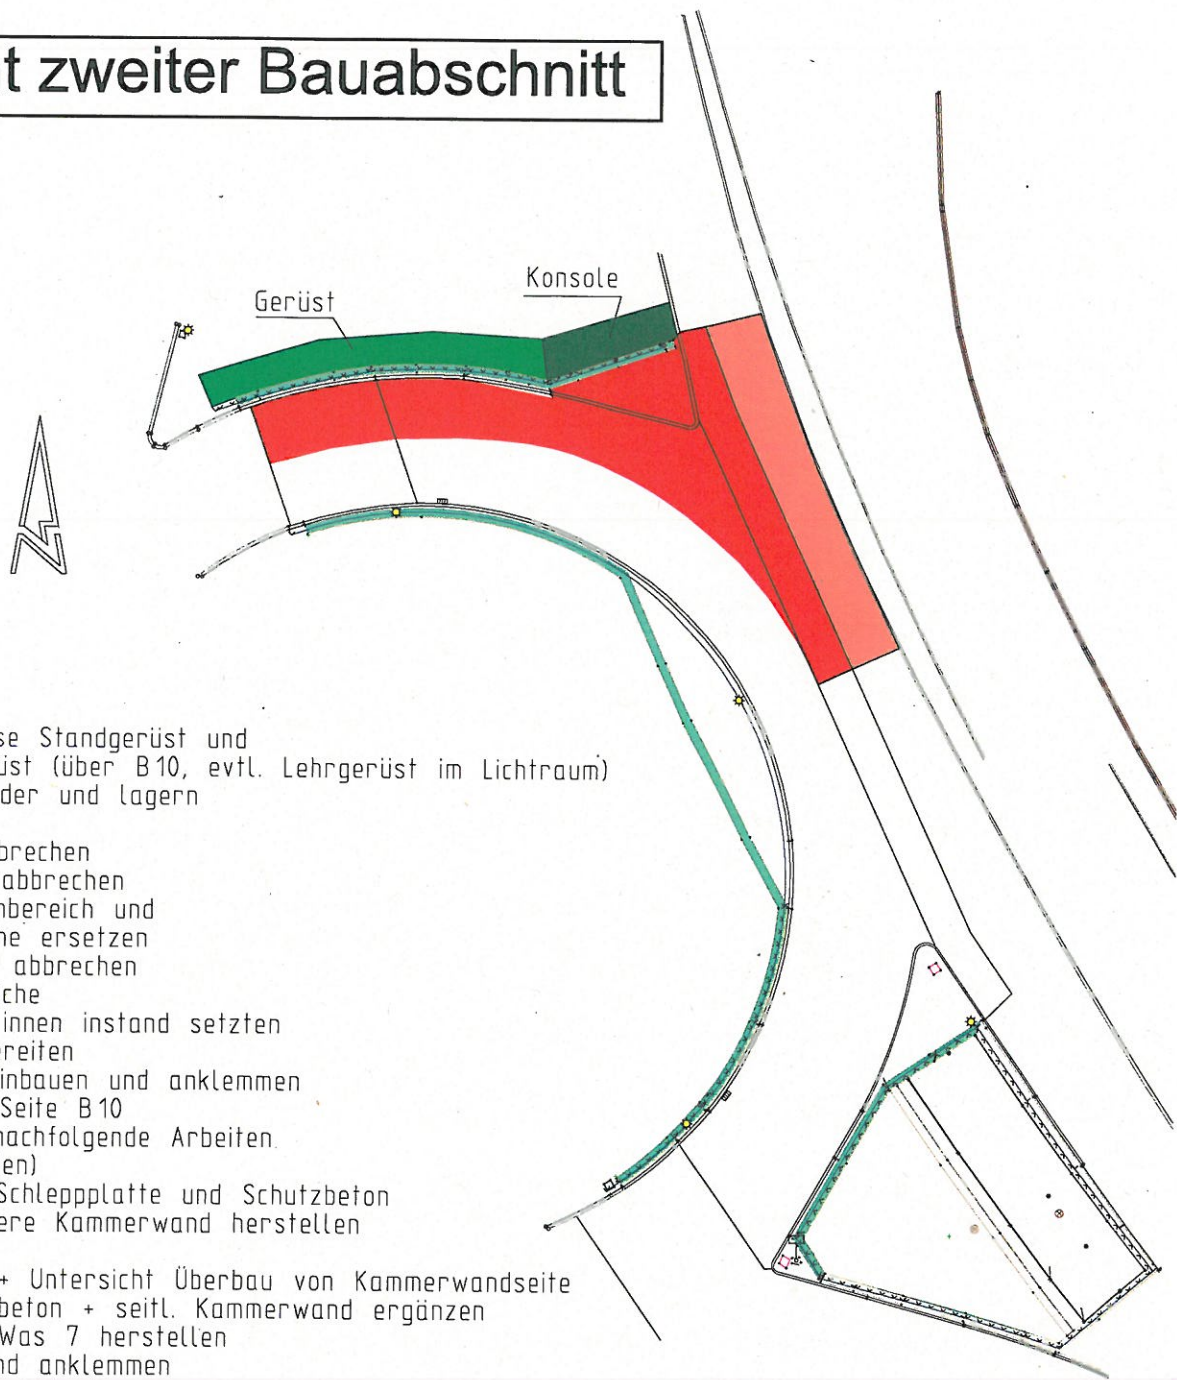


- Verkehrssicherung
- Vermessung
- Gerüst außen, teilweise Standgerüst und teilweise Konsolengerüst (über B10, evtl. Lehrgerüst im Lichtraum)
- Abbau Geländer, Schilder und lagern
- Sparten
- Belag schneiden + abbrechen
- Pflaster + Füllbeton abbrechen
- Schutzbeton im Kappenbereich und teilweise in der Fläche ersetzen
- Borde + Rückenstütze abbrechen
- Abbruch Gesimsoberfläche
- Stirnseite Gesimskopf innen instand setzen
- Betonuntergrund vorbereiten
- teilweise Abdichtung einbauen und ankleben
- Instandsetzung Lager Seite B10
- Schutz der B10 für nachfolgende Arbeiten. (Lagerspalt verschließen)
- Schneiden + Abbruch Schleppplatte und Schutzbeton
- Baugrube Bereich hintere Kammerwand herstellen
- Abbruch Kammerwand
- Instandsetzung Lager + Untersicht Überbau von Kammerwandseite
- Kammerwand + Schutzbeton + seittl. Kammerwand ergänzen
- Entwässerung analog Was 7 herstellen
- Abdichtung einbauen und ankleben
- Schrammbord + Gesims betonieren
- Schutzschicht überhöht einbauen auf Brücke, im Straßenbereich Binder einbauen
- Geländer einbauen
- Rückbau Gerüst

Hellrot

- Restliche Schleppplatte ausbauen
- Auffüllung
- Binder einbauen

Ca. 12-13 Wochen Bauzeit

Übersicht dritter Bauabschnitt

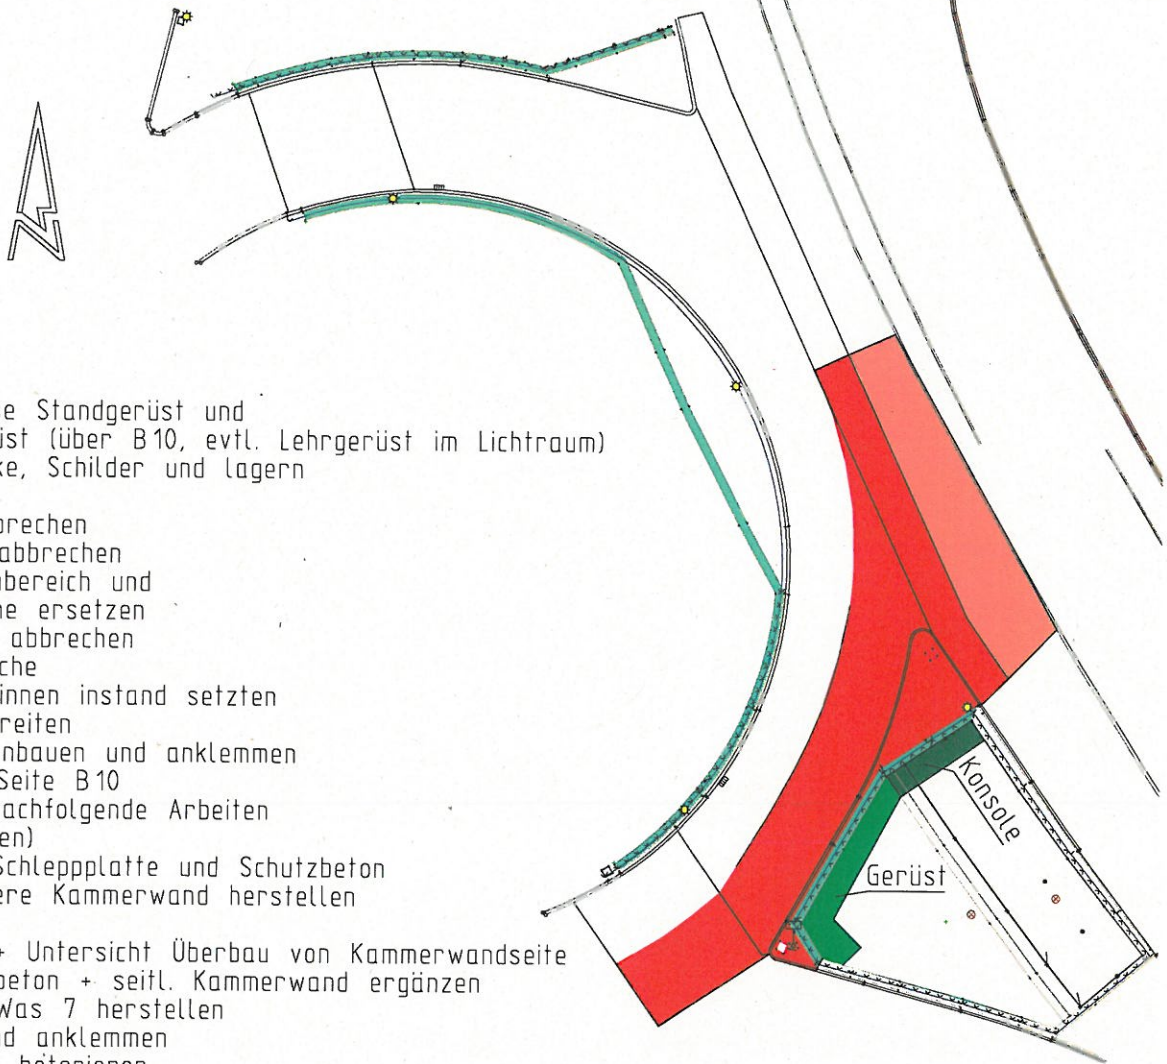



- Verkehrssicherung
- Vermessung
- Gerüst außen, teilweise Standgerüst und teilweise Konsolengerüst (über B10, evtl. Lehrgerüst im Lichtraum)
- Abbau Geländer, Planke, Schilder und lagern
- Sparten
- Belag schneiden + abbrechen
- Pflaster + Füllbeton abbrechen
- Schutzbeton im Kappenbereich und teilweise in der Fläche ersetzen
- Borde + Rückenstütze abbrechen
- Abbruch Gesimsoberfläche
- Stirnseite Gesimskopf innen instand setzten
- Betonuntergrund vorbereiten
- teilweise Abdichtung einbauen und anklemmen
- Instandsetzung Lager Seite B10
- Schutz der B10 für nachfolgende Arbeiten (Lagerspalt verschließen)
- Schneiden + Abbruch Schleppplatte und Schutzbeton
- Baugrube Bereich hintere Kammerwand herstellen
- Abbruch Kammerwand
- Instandsetzung Lager + Untersicht Überbau von Kammerwandseite
- Kammerwand + Schutzbeton + seidl. Kammerwand ergänzen
- Entwässerung analog Was 7 herstellen
- Abdichtung einbauen und anklemmen
- Schrammbord + Gesims betonieren
- Schutzschicht überhöht einbauen auf Brücke, im Straßenbereich Binder einbauen
- Geländer einbauen
- Rückbau Gerüst

Hellrot

- Restliche Schleppplatte ausbauen
- Auffüllung
- Binder einbauen

Ca. 12-13 Wochen Bauzeit

Übersicht vierter Bauabschnitt

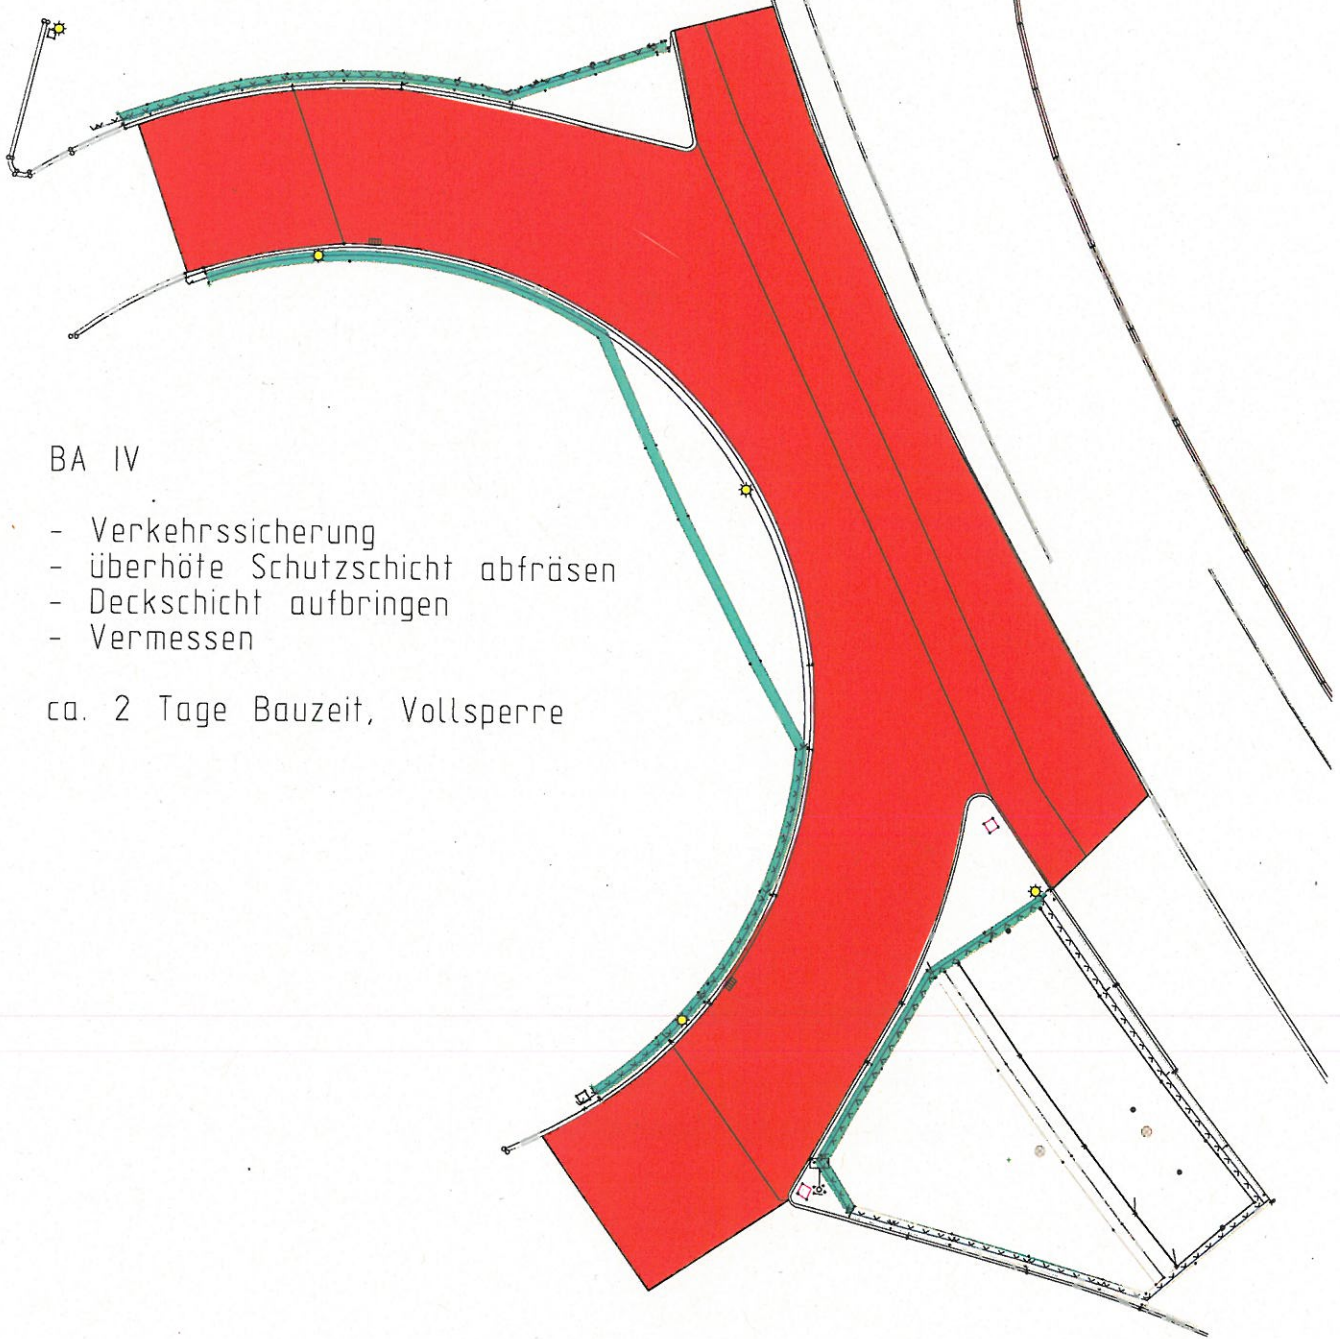

BA IV

- Verkehrssicherung
- überhöhte Schutzschicht abfräsen
- Deckschicht aufbringen
- Vermessen

ca. 2 Tage Bauzeit, Vollsperrung
