


Groberminplan Ersatzneubau Gänstorbrücke

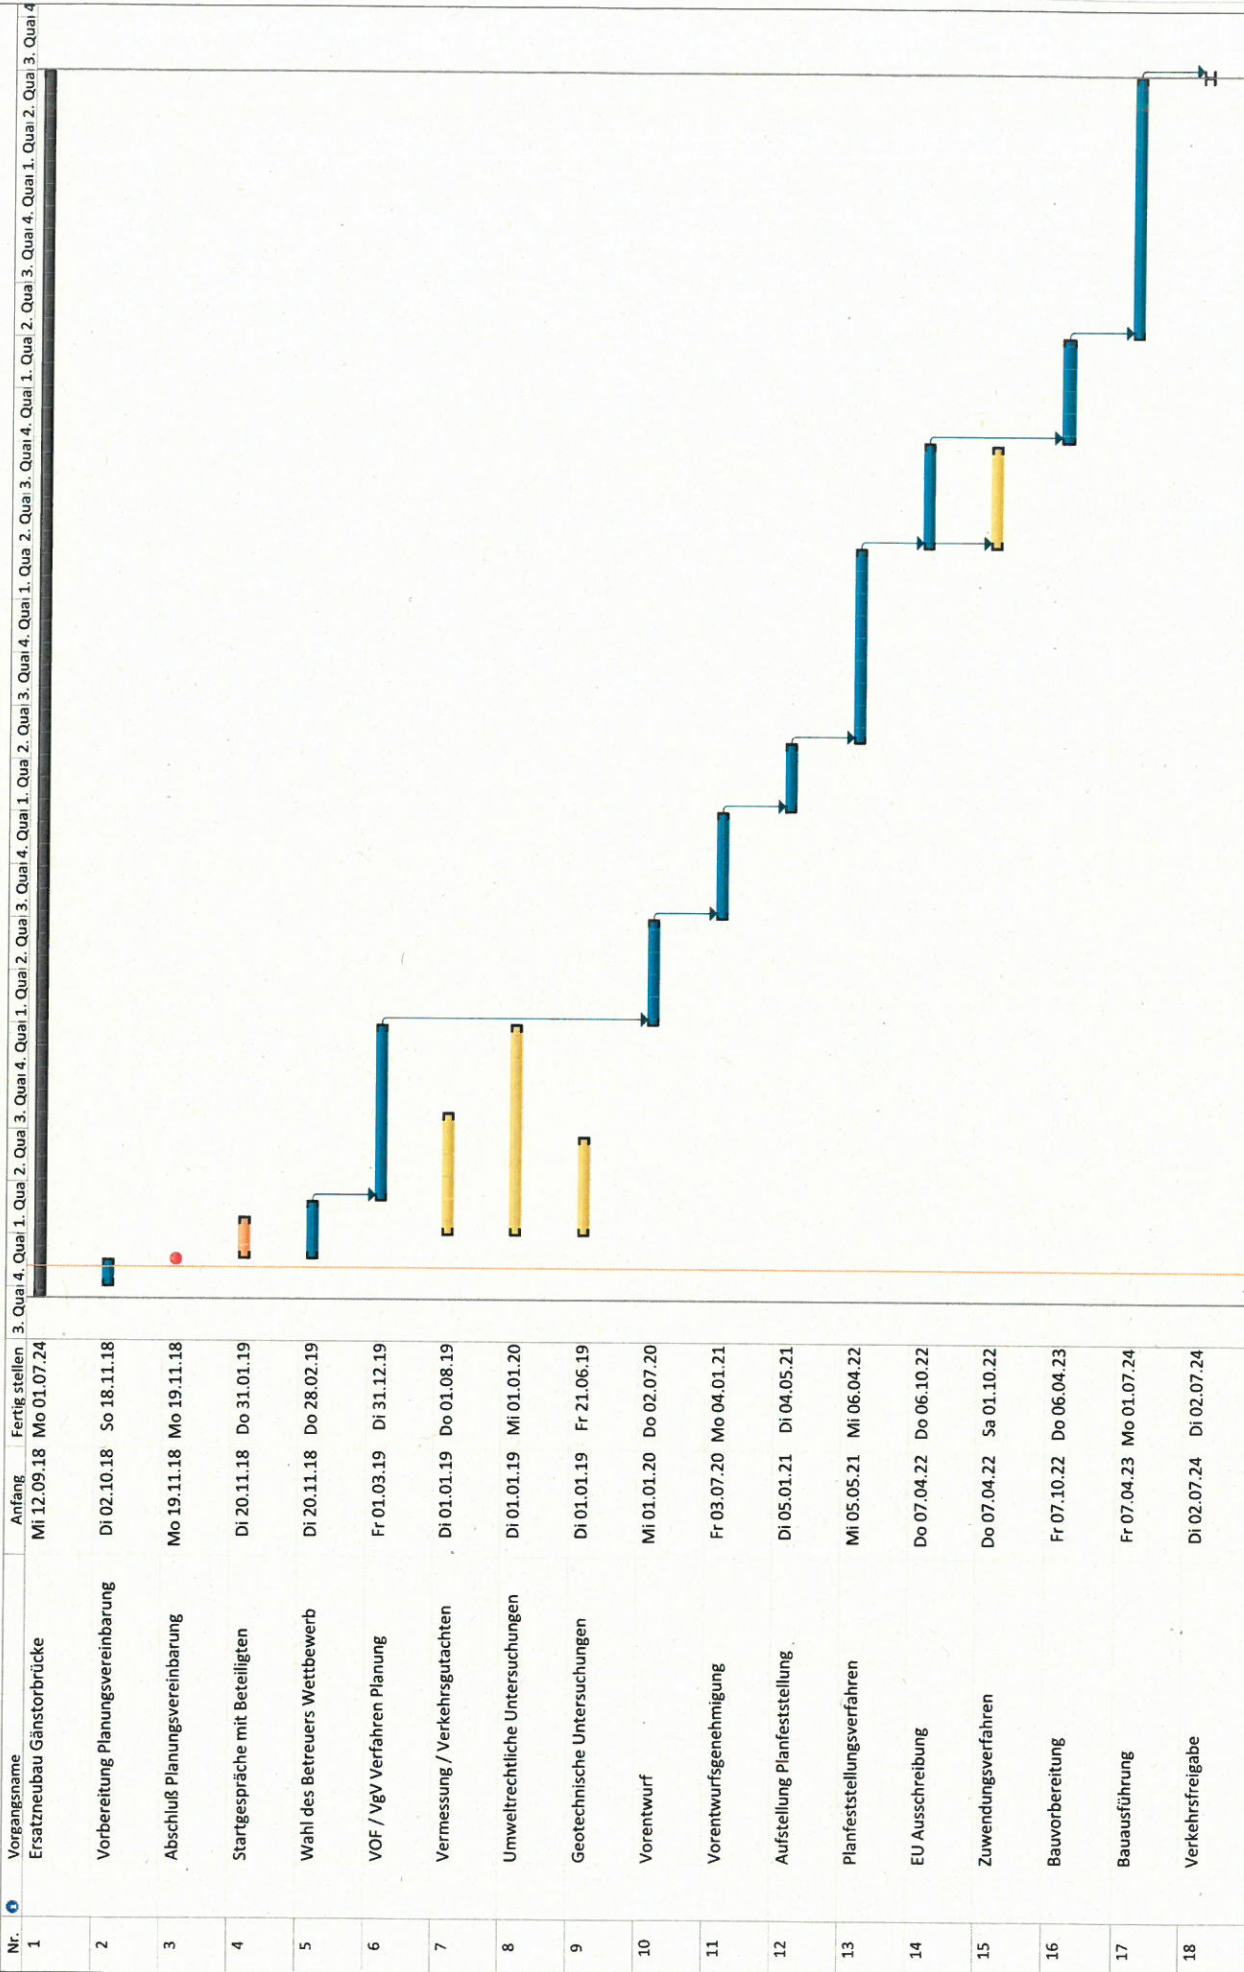

Großterminplan Ersatzneubau Gänstorbrücke

Nr.	Vorgangname	Anfang	Fertig stellen
1	Ersatzneubau Gänstorbrücke	Mi 12.09.18	Mo 01.07.24
2	Vorbereitung Planungsvereinbarung	Di 02.10.18	So 18.11.18
3	Abschluß Planungsvereinbarung	Mo 19.11.18	Mo 19.11.18
4	Startgespräche mit Beteiligten	Di 20.11.18	Do 31.01.19
5	Wahl des Betreuers Wettbewerb	Di 20.11.18	Do 28.02.19
6	VOF / VgV Verfahren Planung	Fr 01.03.19	Di 31.12.19
7	Vermessung / Verkehrsgutachten	Di 01.01.19	Do 01.08.19
8	Umweltrechtliche Untersuchungen	Di 01.01.19	Mi 01.01.20
9	Geotechnische Untersuchungen	Di 01.01.19	Fr 21.06.19
10	Vorentwurf	Mi 01.01.20	Do 02.07.20
11	Vorentwurfsgenehmigung	Fr 03.07.20	Mo 04.01.21
12	Aufstellung Planfeststellung	Di 05.01.21	Di 04.05.21
13	Planfeststellungsverfahren	Mi 05.05.21	Mi 06.04.22
14	EU Ausschreibung	Do 07.04.22	Do 06.10.22
15	Zuwendungsverfahren	Do 07.04.22	Sa 01.10.22
16	Bauvorbereitung	Fr 07.10.22	Do 06.04.23
17	Bauausführung	Fr 07.04.23	Mo 01.07.24
18	Verkehrsfreigabe	Di 02.07.24	Di 02.07.24

4
